


(仮称) 地域エネルギーセンター等整備・運営事業

■工事進捗状況（12月8日時点） 鉄骨建て方完了

忠岡町し尿処理施設解体撤去事業、中継施設整備事業、中継施設運営事業及び忠岡町一般廃棄物外部委託処理事業に係る実施協定に基づき、令和 5 年 8 月 21 日から令和 6 年 3 月 31 日を工期として中継施設整備工事を実施しています。



■全体スケジュール案

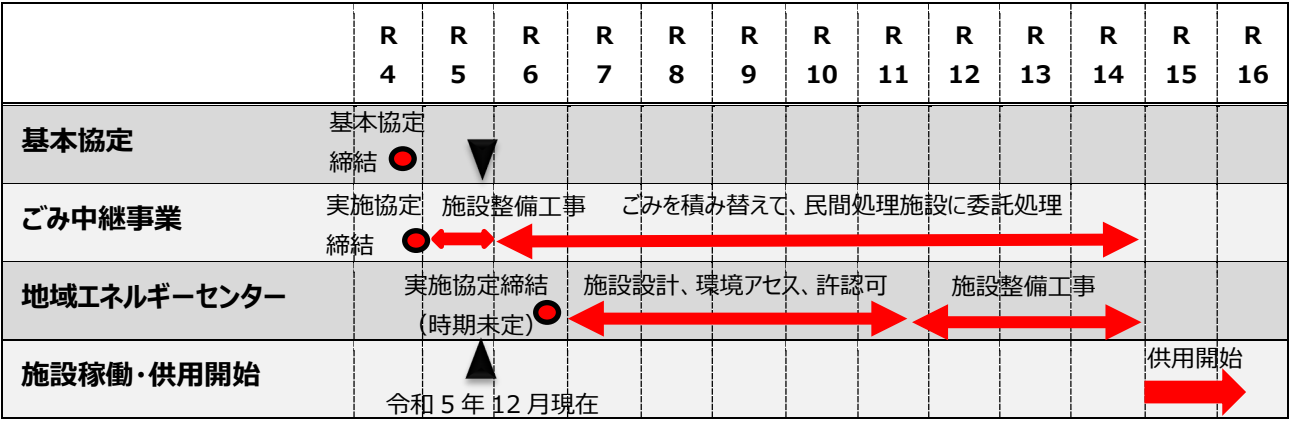

■今後の予定

日 時	内 容
令和 5 年 1 2 月	中継事業委託契約についての協議
令和 6 年 3 月末	中継施設完成
令和 6 年 4 月 1 日	ごみ中継事業開始
令和 6 年 4 月以降	新施設実施協定の締結に係る協議開始
